


第1期施設解体撤去・先行工事の実施状況について

北九州PCB処理事業所

解体撤去の進め方(予定)

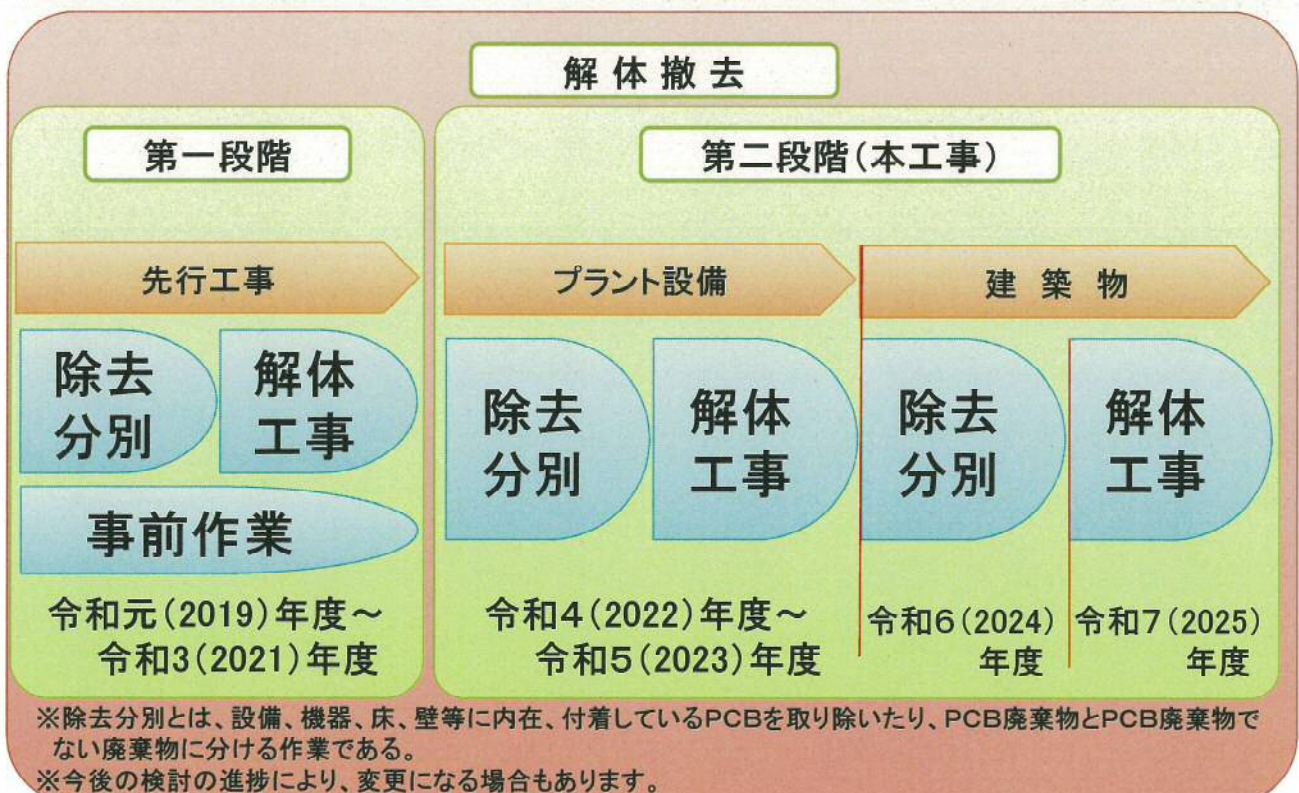

先行工事の実施状況について

- ◆グローブボックス(GB)本体と粗解体設備の解体工事については安全に工事が完了し、破砕分別室については令和3年1月に着工を開始しています。
- ◆今後、VTR設備についても新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮しながら、進めていく予定です。

	令和元年度	令和2年度				令和3年度
		4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
先行工事 (全体)	→					
GB本体			9/10	11/12		
粗解体設備		7/8	10/5			
破砕分別室					1/4	→
VTR等設備						→

先行工事

