


# 北九州PCB処理事業所

## 第1期施設解体撤去工事 の実施について

1

### 北九州1期施設解体撤去の実施状況

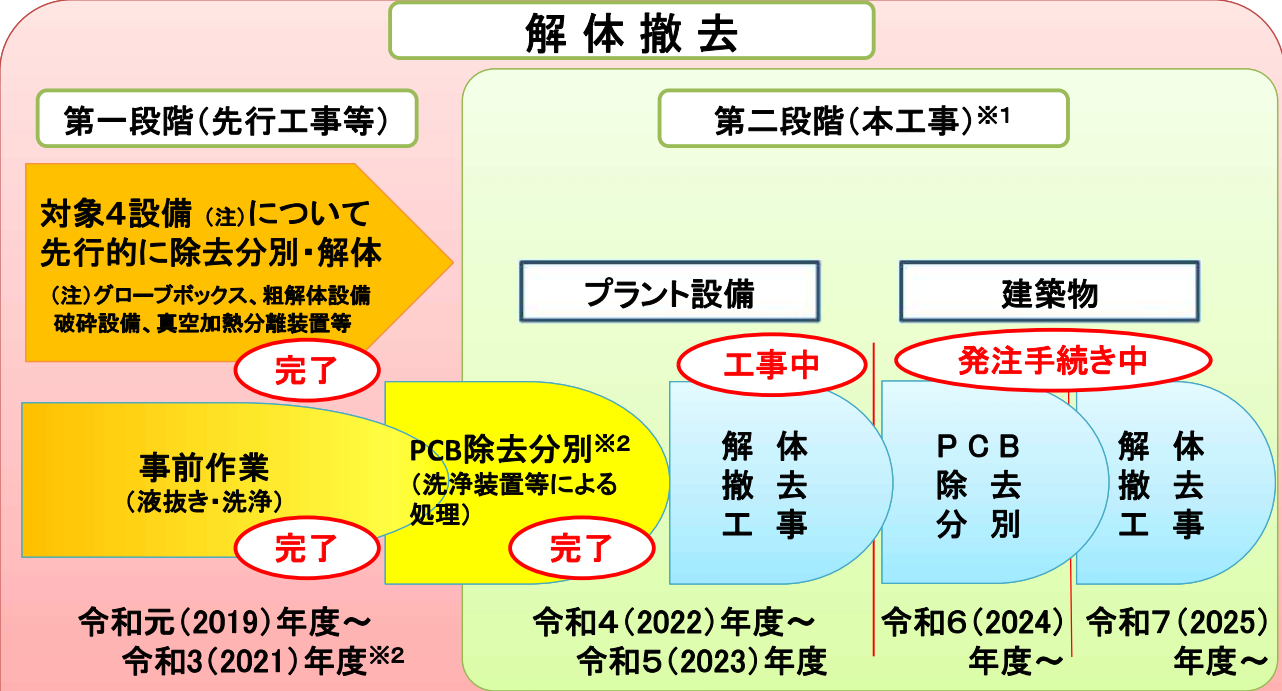


※1: 第二段階(本工事)のスケジュールについては、今後の検討の進捗により、変更になる場合もあります。  
 ※2: PCB除去分別とは、設備、機器等に残存あるいは付着している高濃度PCBを洗浄装置、VTR装置やふき取りにより取除く作業です。事前作業等により、高濃度PCBが確認された周辺設備(配管・ダクト・ポンプ)の除去分別は、令和4年12月末で撤去等が完了し、配管等は2期VTR設備等で処理しました。

2

# 除去分別実施箇所


除去分別は、事前作業後一部残存した高濃度PCB付着箇所を除去するための作業で、配管等が撤去対象です。それに加え、事前作業ができない排気ダクトも実施しました。

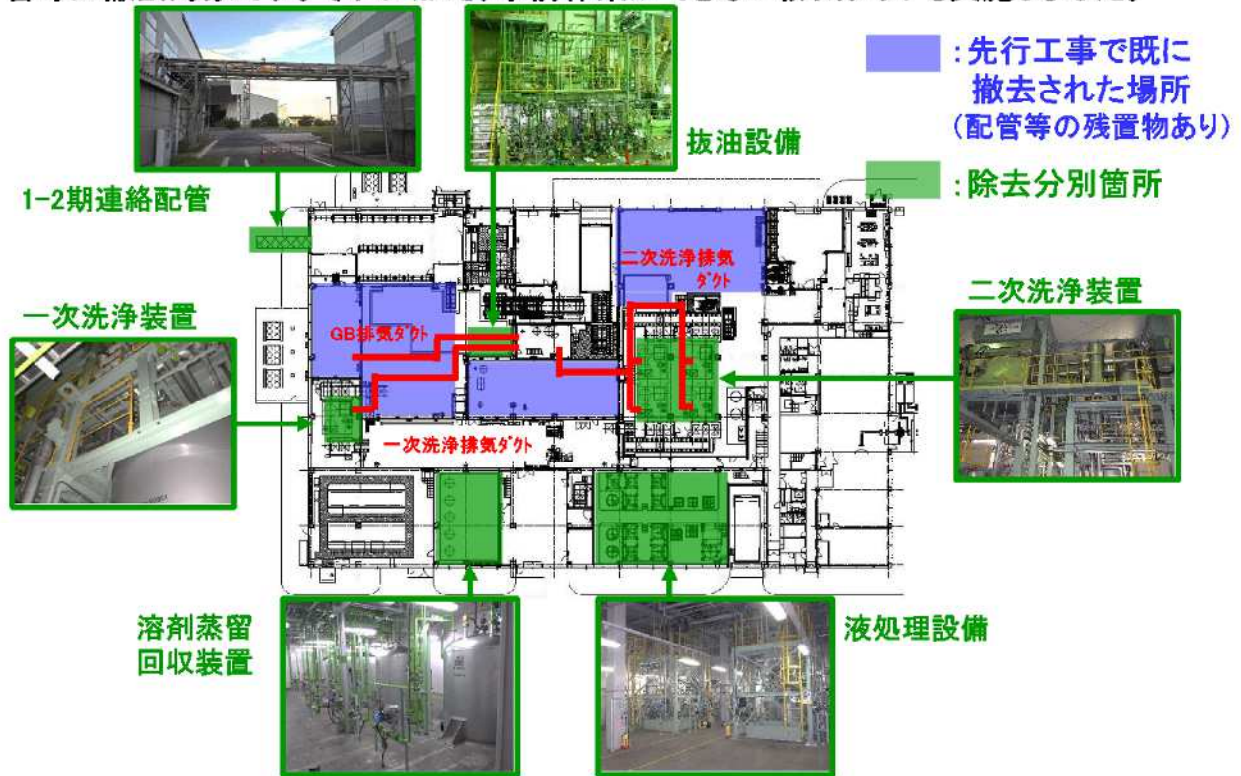

3

# プラント設備のPCB除去分別（溶剤蒸留回収装置）

◆溶剤蒸留回収装置の配管等や塔槽類を事前作業で洗浄した後、真空加熱分離装置（VTR）等で処理。

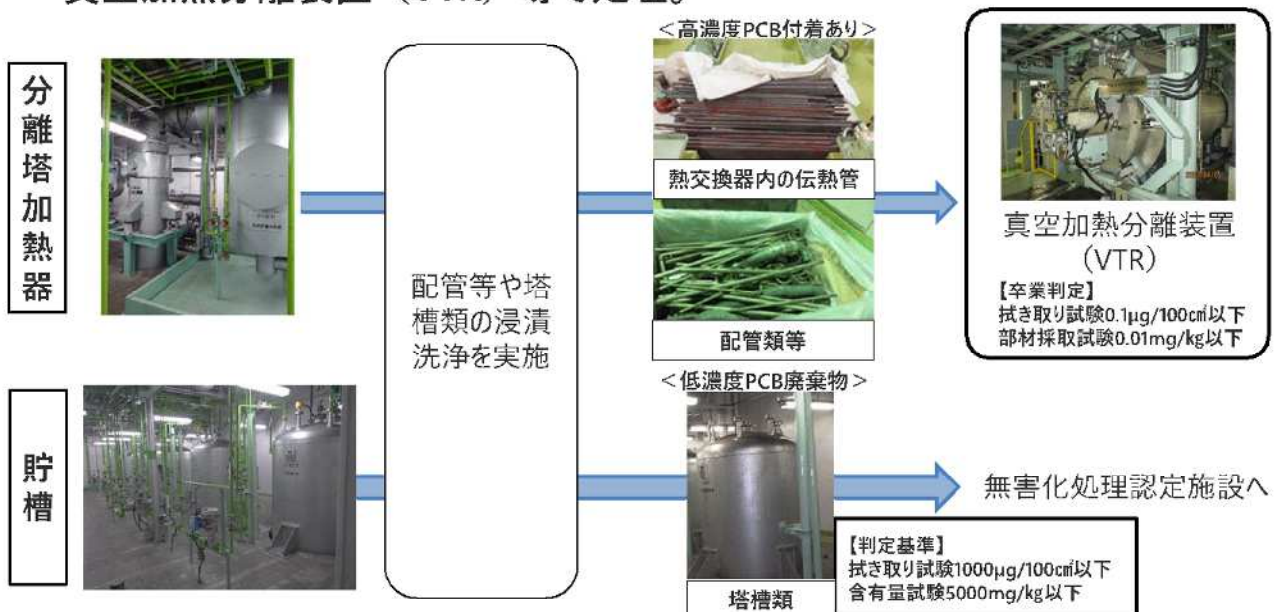

※PCB除去分別とは、設備、機器等に残存あるいは付着している高濃度PCBを洗浄装置やVTR装置、拭き取りにより取り除く作業。

4

# プラント設備解体撤去工事の進捗状況①

## ● 工事工程

・共通仮設工事: 令和5年1月～令和5年4月

① 令和5年1月～令和5年2月: 工事事務所・休憩所等の共通仮設工事が完了

② 令和5年2月～4月: 1期施設の間仕切壁に扉・シャッター付き開口を設置

・プラント設備の解体撤去: 令和5年3月～令和6年6月

① 令和5年3月～6月: 壁開口設置後、搬出ルート確保のための機器類撤去が完了

② 令和5年4月～令和6年6月: プラント設備の解体撤去中


項目	令和4年度				令和5年度				令和6年度
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月
PCB付着状況調査・除去分別 PCB除去確認調査	■								
共通仮設工事 ①仮設工事事務所等の設置 ②壁開口設置工事				■ ① ■ ②					
プラント設備の解体撤去工事 ①搬出ルート上の機器撤去 ②プラント設備の解体撤去					■ ①				
						■ ②			

工事進捗中


5

# プラント設備解体撤去工事の進捗状況②

着手前

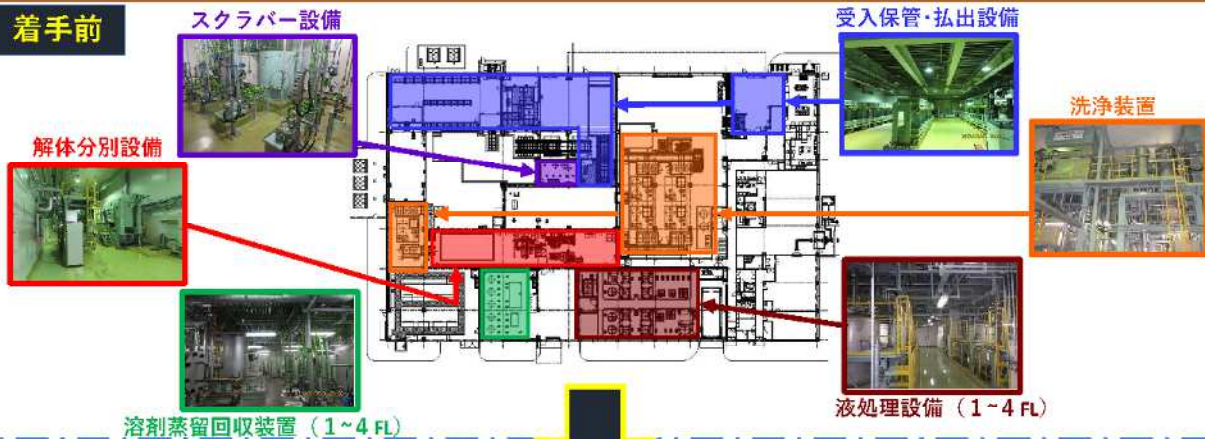

現在

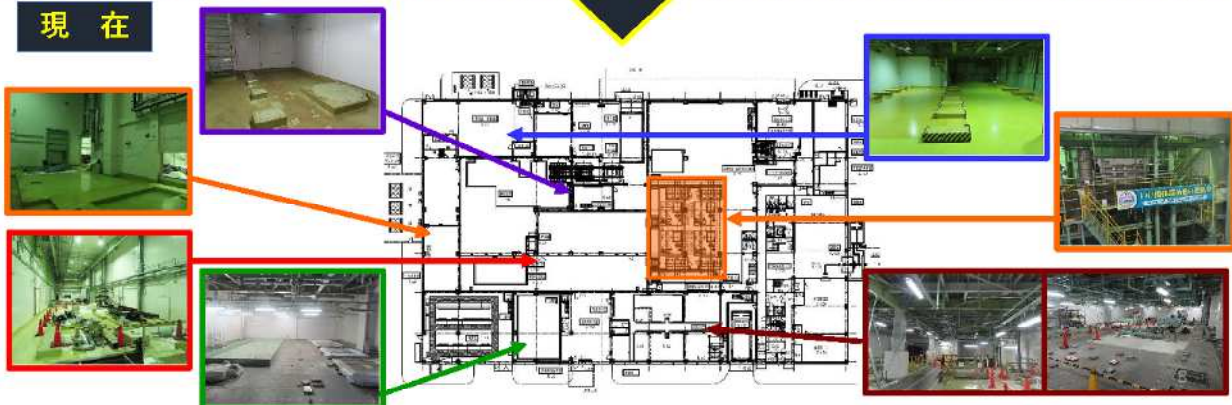

6
